

ПРОТОКОЛ № 1 / 2025
ЗА ИЗПИТВАНЕ НА ВИБРАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ХГ В
МВЕЦ „ЧУРЕКОВСКА“

1.Дата на провеждане на изпитването: 31.05.2025г.

Изпитването е проведено в съответствие с:

- БДС EN 60034-4:2008
- IEEE std 43:2000
- БДС ISO 10816-5:2002


2.Хидрогенератор ХГ тип: вертикален синхронен SGA 9C 06 T, производство на фирма Hitzinger

-номинална пълна мощност	$S_n = 1500 \text{ kVA}$
-номинално напрежение	$U_n = 420 \text{ V}$
-номинален ток	$I_n = 2062 \text{ A}$
-номинален к.п.д.	$\eta = 95,8\%$
-номинален фактор на мощността	$\cos\varphi = 0,9$
-номинална скорост	$n_n = 1000 \text{ min}^{-1}$
-максимална (разгонна) скорост	$n_{\max} = 1850 \text{ min}^{-1}$
-тегло	$G = 6200 \text{ kg}$
-Преден лагерен възел	6240 M/C3
-Заден лагерен възел	7320 BECBP

3. Изпитване на електрическите параметри на страторната намотка на ХГ

3.1 Изпитване на изолационното съпротивление на статорната намотка към корпус – мегер 1000V

$R_{из15}$	$R_{из60}$	$K_{абс.}$	$I_{утечка}$	$t_{ок}$
$G\Omega$	$G\Omega$	-	μA	$^{\circ}C$
2.09	4.03	1.90	0.263	

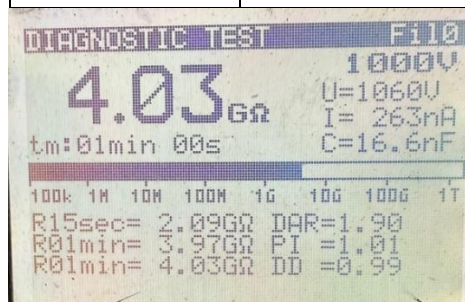

3.2 Измерване на активното съпротивление на статорната намотка на ХГ при температура на намотката 27 °C

$$R_U = 1.200\text{m}\Omega$$

$$R_V = 1.201\text{m}\Omega$$

$$R_W = 1.202\text{m}\Omega$$

Трите фази са със съпротивления на фазите, различаваща се със стойност по-малка от 3%, което съответства на напълно симетрична намотка.

4. Измерване на вибрационното състояние на хидроагрегата ХА:

Хидроагрегатът ХА включва хидрогенератор ХГ и задвижващата турбина.

Те са твърдо куплирани и вибрационното им състояние се определя при съвместната им работа под товар.

Турбината няма собствени лагери и е монтирана директно на вала на хидрогенератора.

4.1 Режим на работа – ХА работи в продължение на 42:33 часа


- Околна температура	$t_{ok} = 16.2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Пълна мощност	$S = 134\text{kVA}$
- Активна мощност	$P_{\text{работна}} = 120.50\text{kW}$
- Статорен ток	$I = 185\text{A}$
- Статорно напрежение	$U = 401\text{V}$
- Температура на фаза U	$t_U = 24.1\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура на фаза V	$t_V = 27.2\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура на фаза W	$t_W = 26.3\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура на преден лагер	$t_{\text{пр.лагер}} = 21.8\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Температура на заден лагер	$t_{\text{зад.лагер}} = 31.2\text{ }^{\circ}\text{C}$



Измерването е проведено при 9% мощност на ХГ.

№	Ос на ХГ	Преден лагер			Заден лагер		
		Вибр. скорост	Вибрационно ускорение $0 < f < 10000 \text{ Hz}$		Вибр.	Вибрационно ускорение $0 < f < 10000 \text{ Hz}$	
			max	rms		max	rms
		v, mm/s	m/s ²	m/s ²	v, mm/s	m/s ²	m/s ²
1	X	0,218	0.840	2.127	0,267	0.525	2.141
2	Y	0,179	0.322	1.378	0,999	0.499	1.182
3	Z	0,277	0.345	1.032	1,088	0.629	1.688



Диаграми на вибрационната скорост и ускорение на преден лагер по трите оси X, Y и Z.


- Диаграми на вибрационна скорост на преден лагер

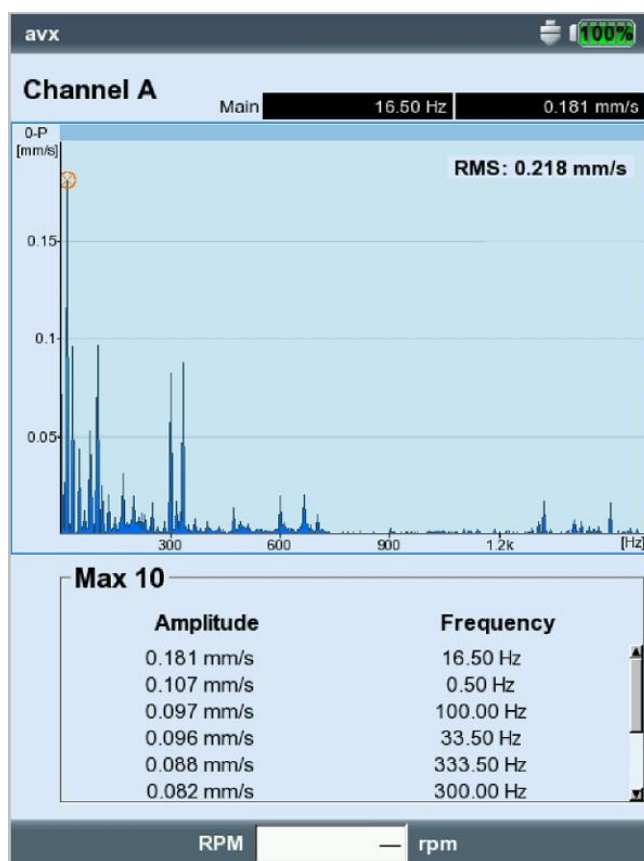

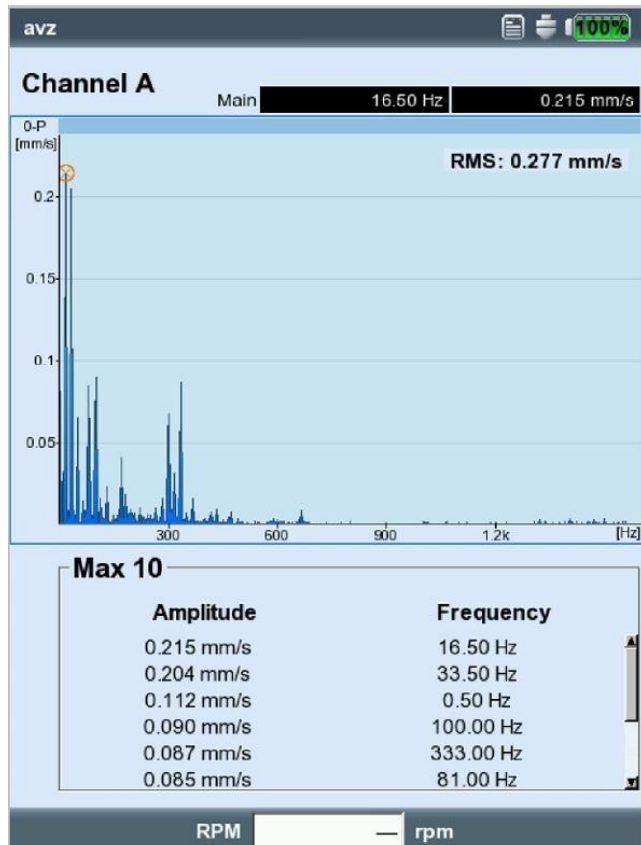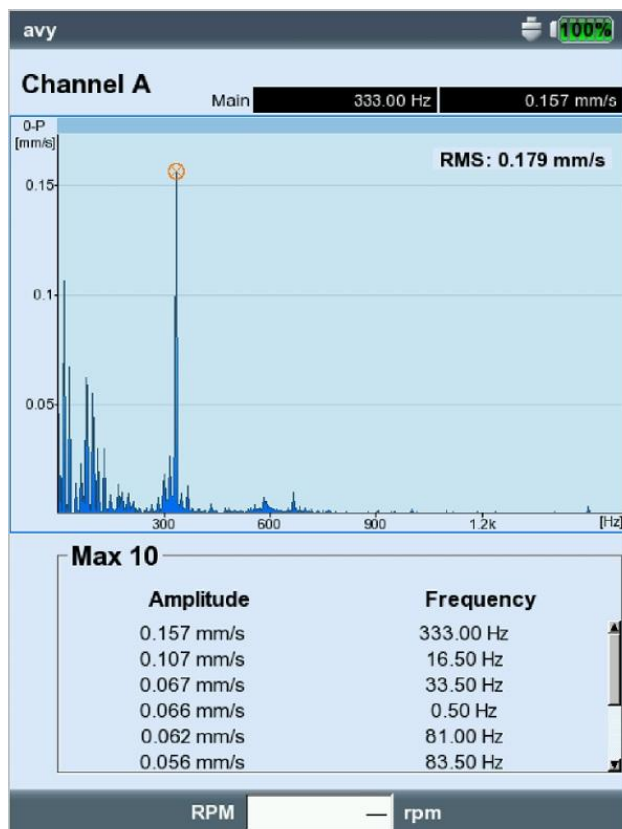




- Диаграми на вибрационна скорост на заден лагер

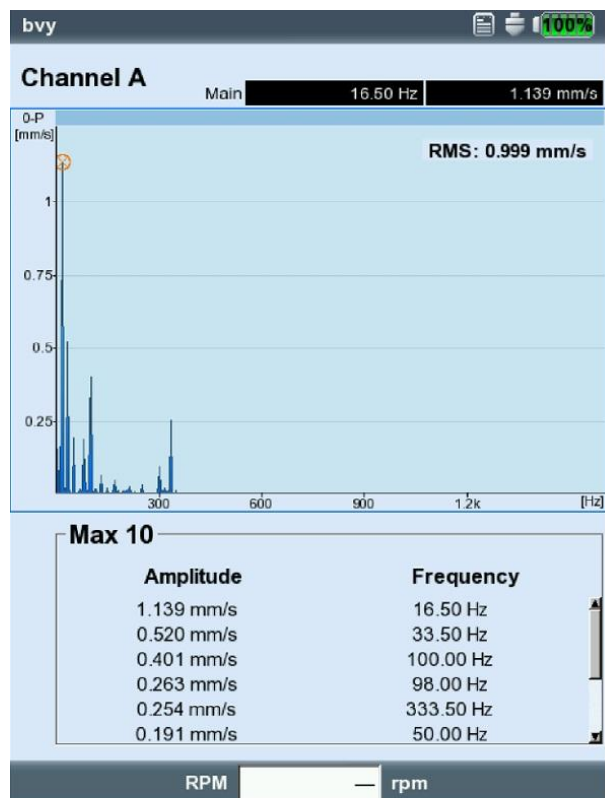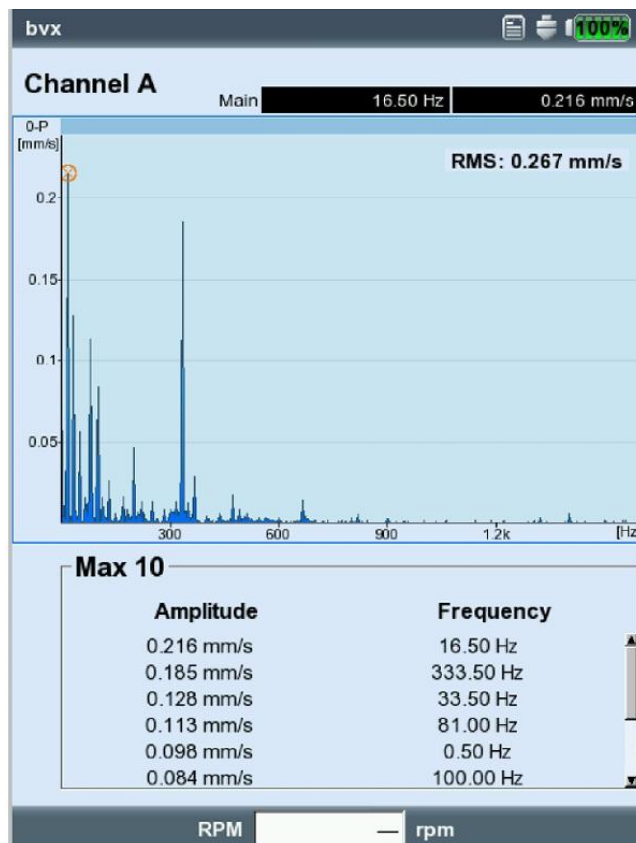


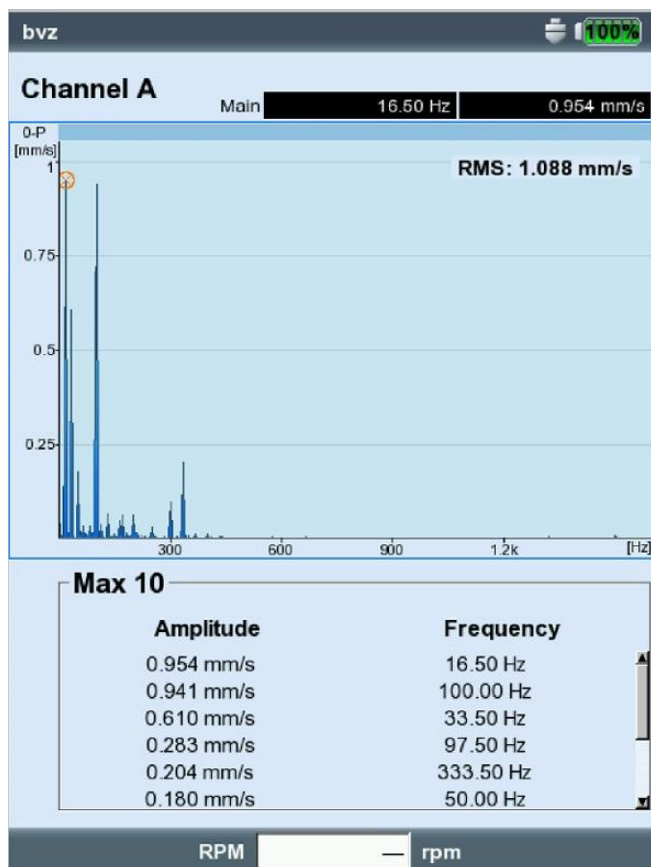



- Ускорение на преден лагер

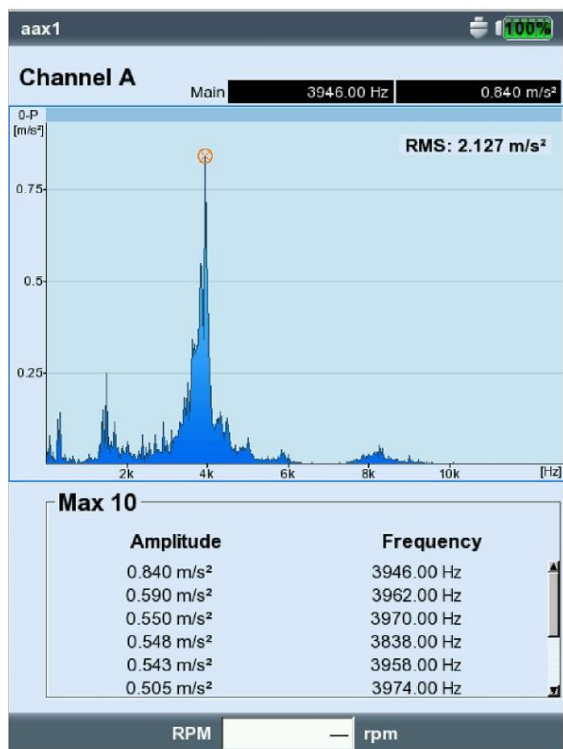

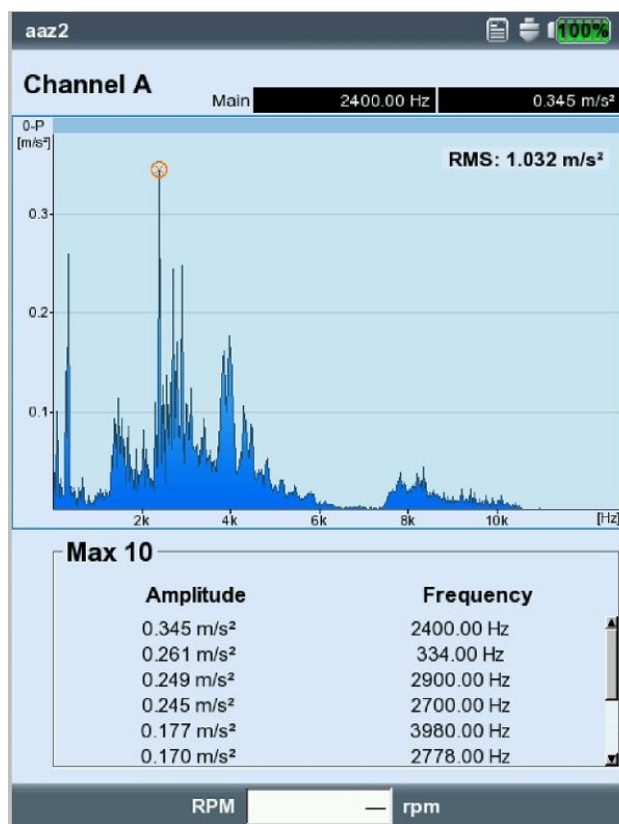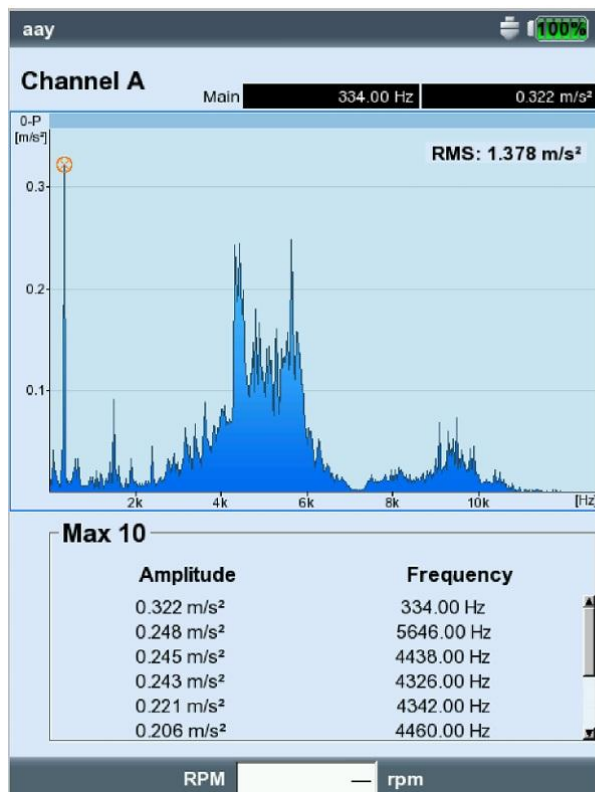

- Ускорение на заден лагер

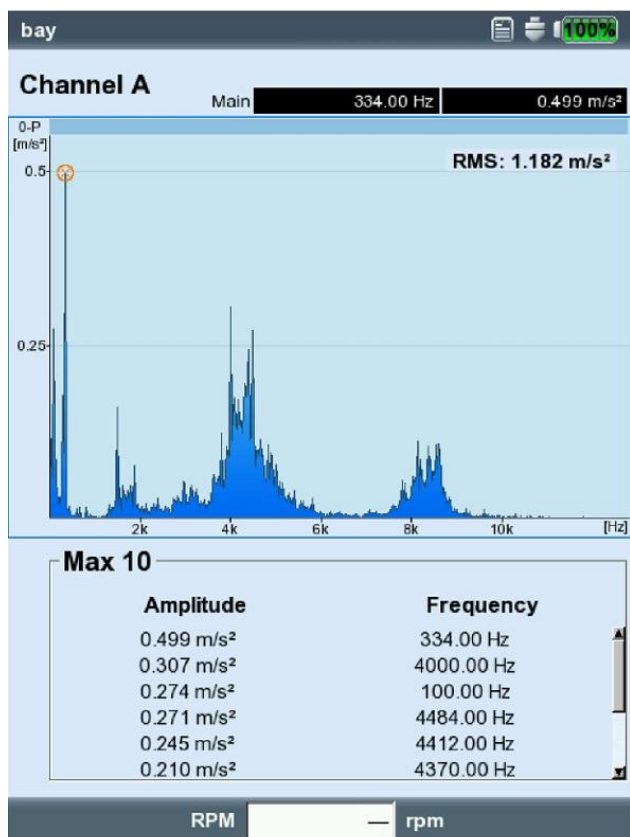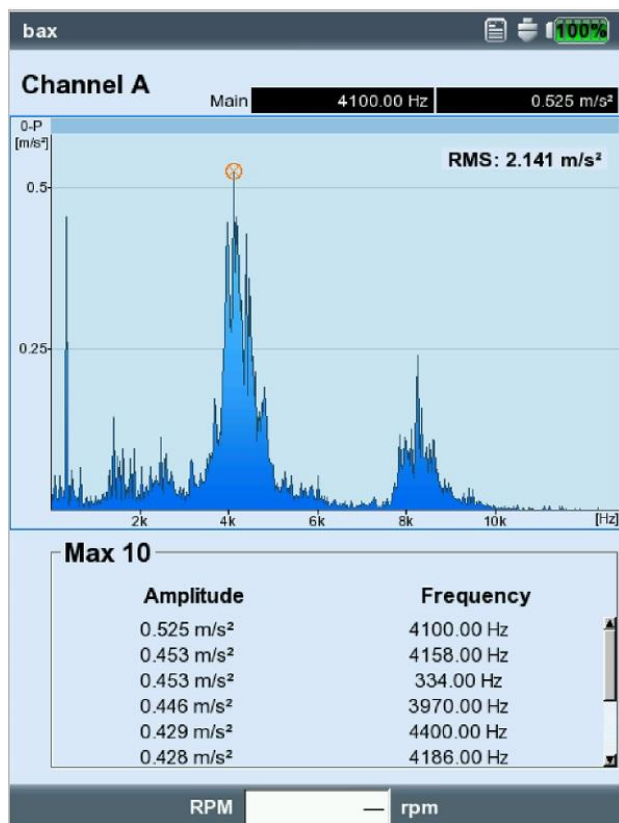

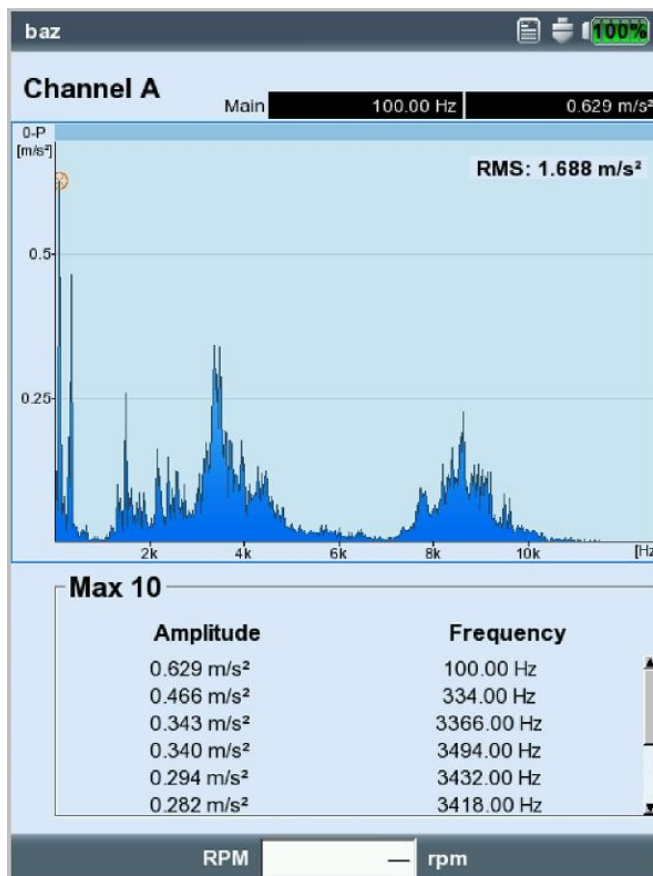

Резултат:


Резултатите от изпитването показват ниски стойности на вибрационната скорост за двата лагерни възела – от страна на турбината и противоположния край, по-ниски от допустимата стойност 1,6 mm/s за нов лагерен възел.

5. ТЕРМОВИЗИЯ НА ХГ

Загряването на ХГ е измерено с термовизионна камера при режим на работа след 0:05 часа при околна температура 16.2 °C.

- Метод на контрол МЕК 60034-14/2007; IEC 60034-14-2007
- Нормативни изисквания: BDS ISO 10816 – 5/2008, БДС EN 60076 – 2/2011, Наредба 1 (ДВ бр.46/2010г., изм. И доп. ДВ бр.95/2016г.)

- Преден лагер

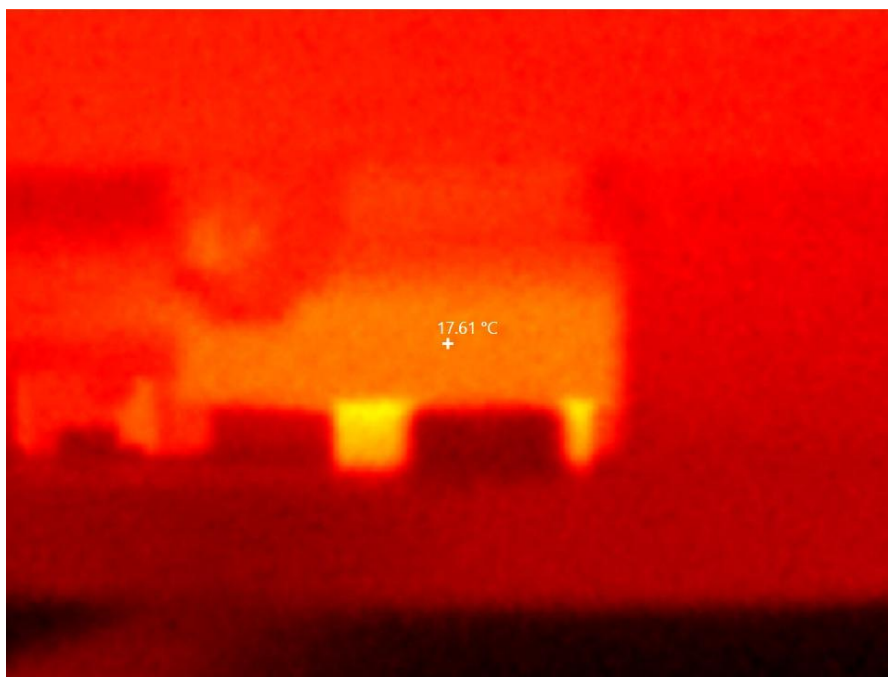

- Заден


лагер




- Статорно тяло



- Изводно устройство

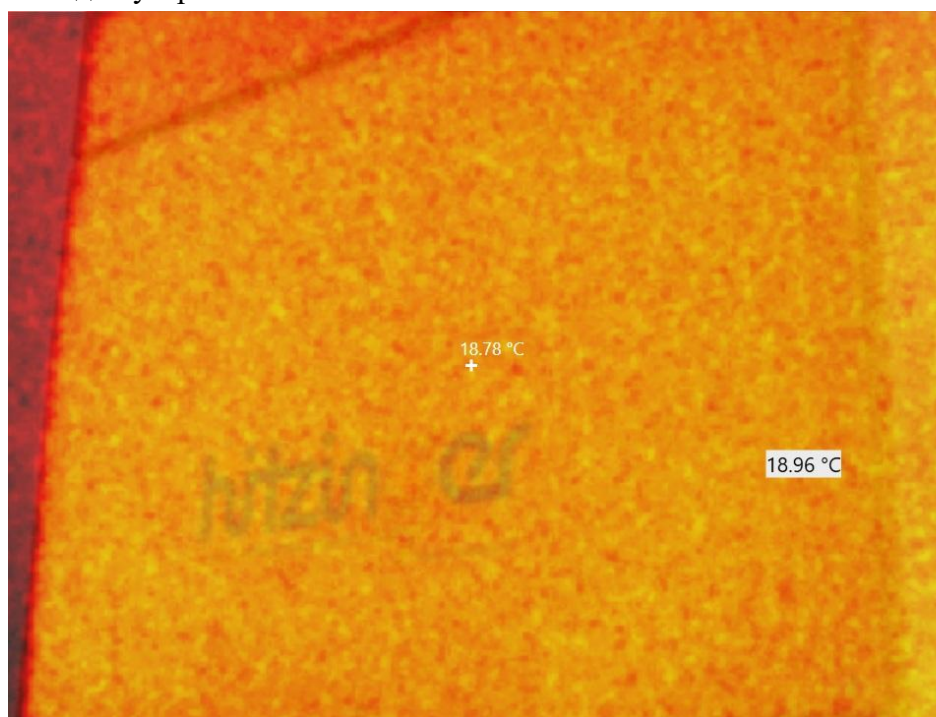

- Изводни проводници

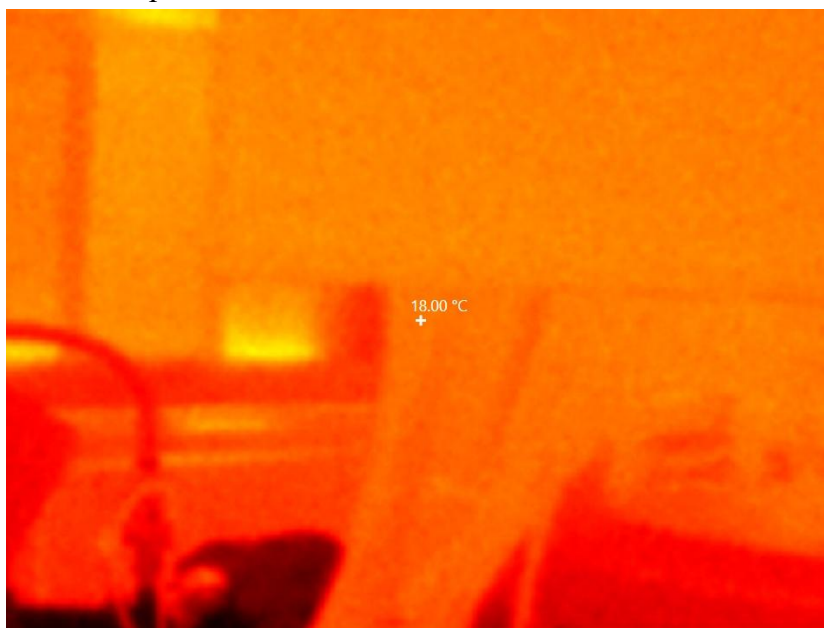

- МНУ



Максималното загряване на елементите на ХГ: на корпуса на предния лагер е 26.49 °С, на корпуса на задния лагер е 45.23 °С, на корпуса на генератора е 27 °С, на изводните шини на генератора е 24.93 °С, на масло охладителя е 48.03 °С.

	Макс. температура	Околна температура	Макс. прегряване	Допустима температура
Дименсия	°С	°С	°С	°С
Статорни Намотки	27.2	16.2	11	105
Преден лагер	21.8	16.2	5.6	90
Заден лагер	31.2	16.2	15	90
Шини на изводна кутия	18	16.2	1.8	90
Корпус на ХГ	22.8	16.2	4.6	90
МНУ – охладител	22.49	16.2	6.29	90


От направените измервания с вградените датчици и термовизионна камера следва, че няма елементи и възли на ХА, които да нагряват над допустимите стойности.

6. ТЕРМОВИЗИЯ НА БЛОЧНИЯ ТРАНСФОРМАТОР С МОЩНОСТ 1600kVA

Загряването на силовия трансформатор е измерено с термовизионна камера при режим на работа след 0:05 часа при околна температура 16.2 °С.

- Метод на контрол МЕК 60034-14/2007; IEC 60034-14-2007
- Нормативни изисквания: BDS ISO 10816 – 5/2008, БДС EN 60076 – 2/2011, Наредба 1 (ДВ бр.46/2010г., изм. И доп. ДВ бр.95/2016г.)


- Изводи НН

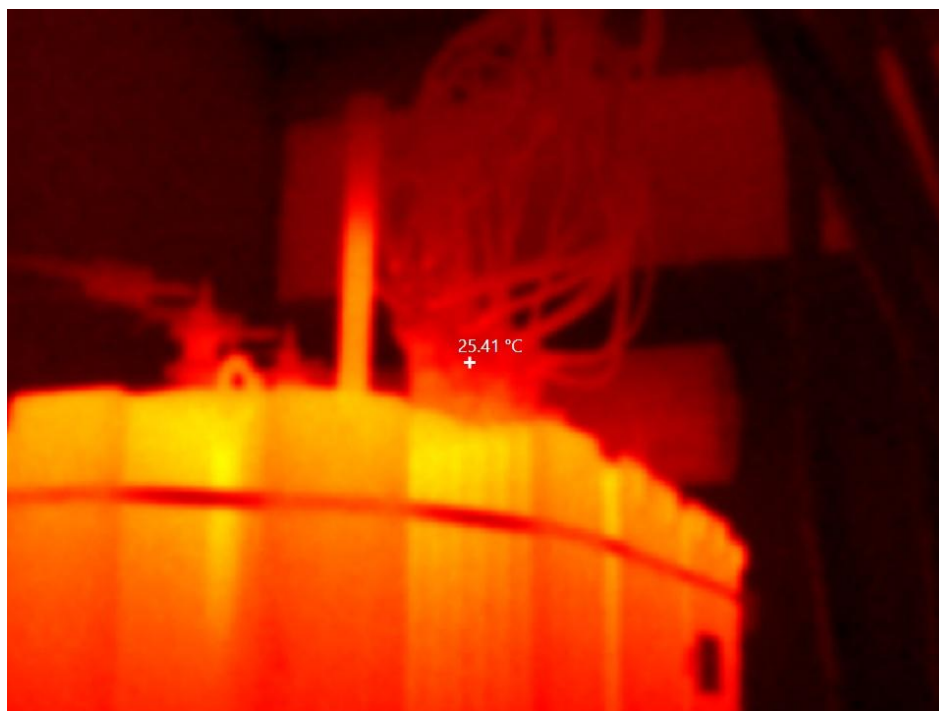

- Изводи ВН



- Охладител трансформатор

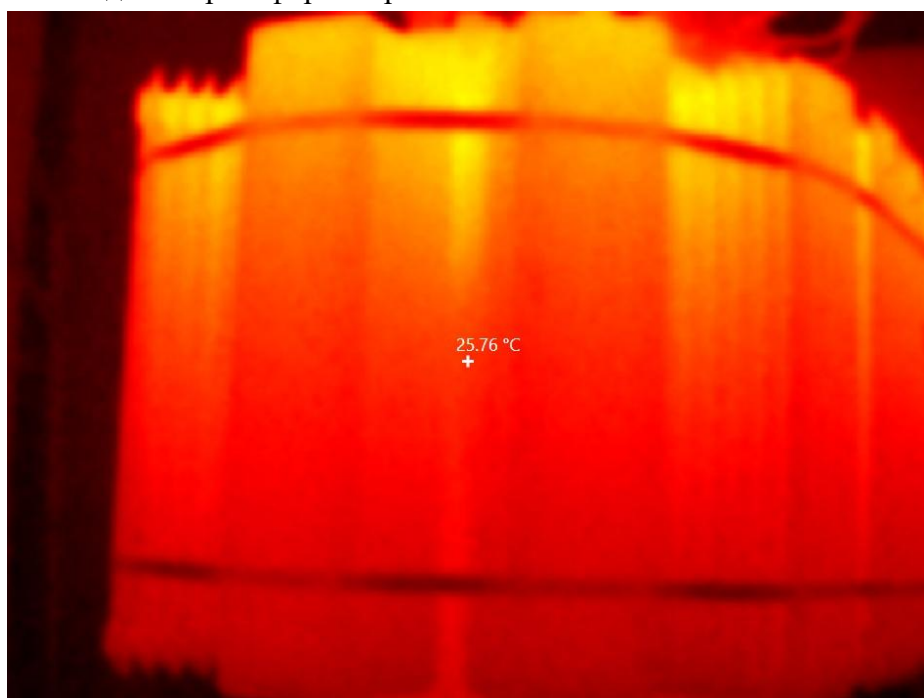

Максимално загряване на елементите на трансформатора: на изводи НН 29.58 °С; на изводи ВН 29.26 °С; на капака на трансформатора 38.07 °С; на охладителя 36.97 °С


	Макс. температура	Околна температура	Макс. прегряване	Допустима Температура
Дименсия	°С	°С	°С	°С
Изводи НН	25.41	16.2	9.21	90
Изводи ВН	21.26	16.2	5.06	90
Кабели НН	21.52	16.2	5.32	90
Кабели ВН	21.32	16.2	5.12	90
Капак трансформатор	28.70	16.2	12.50	90
Охладител	25.76	16.2	9.56	90

От направените измервания с термовизионната камера следва, че няма елементи и възли на силовия трансформатор, които да загряват над допустимите стойности.


7. ТЕРМОВИЗИЯ НА ПРЕКЪСВАЧ И РАЗЕДИНИТЕЛ

Загряването на прекъсвача и разединителя е измерено с термовизионна камера при режим на работа след 0:15 часа при околна температура 16.2 °C.

- Метод на контрол МЕК 60034-14/2007; IEC 60034-14-2007
- Нормативни изисквания: BDS ISO 10816 – 5/2008, БДС EN 60076 – 2/2011, Наредба 1 (ДВ бр.46/2010г., изм. И доп. ДВ бр.95/2016г.)
- Прекъсвач

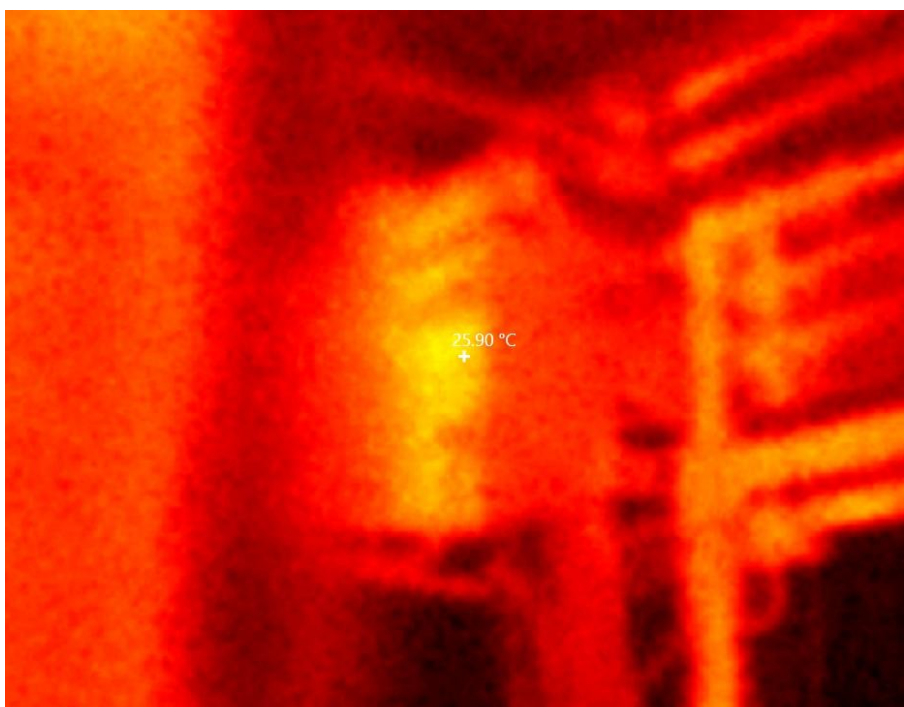

- Разединител

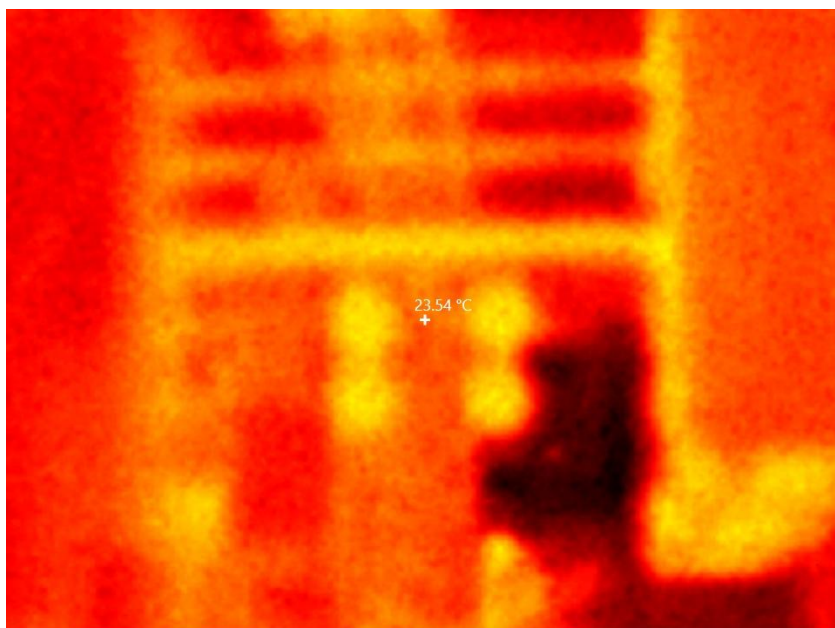

	Макс. температура	Околна температура	Макс. прегряване	Допустима Температура
Дименсия	°C	°C	°C	°C
Прекъсвач	25.90	16.2	9.70	90
Разединител	23.54	16.2	7.34	90

От направените измервания с термовизионната камера следва, че няма елементи и възли, които да загряват над допустимите стойности.

8. МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА

Температурата на работните помещения е в съответствие с изискванията на Наредба РД-07-3 от 18.07.2014г. касаещи проблема за минималните изисквания относно температурата на работните места – 20 °C. Тъй като централата е с дистанционно управление в работните помещения няма постоянно работещ персонал. Персонала е в централата само при извършване на ремонтни дейности и настройка на апаратурата.

9. ИЗПОЛЗВАНА АПАРАТУРА

- Smart Balancer type VIB 5.310 SR Schenck
- Мегаомметър Metrel 10kV
- Микроом метър – Hioki RM3548
- Термо камера Fluke TiS45

10. АНАЛИЗ И ИЗВОДИ

Електрическите изпитания на ХГ показват много добро състояние и ХА може да бъде да бъде в експлоатация неограничено дълго време.

Направените изпитания на вибрационното състояние на ХА показва нормални нива на вибрациите, отговарящи на много добро състояние на лагерните възли. ХА може да бъде в експлоатация неограничено дълго време.

Направеното термовизионно изследване на ХА, силовия трансформатор, разединителя и прекъсвача показва общо много добро състояние без прегравяне на възлите и елементите.

11. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Направените електрически, вибрационни и топлинни измервания показват, че елементите, възлите и агрегатите на МВЕЦ „ЧУРЕКОВСКА“ са в добро техническо състояние.

Централата може да работи без проблемно неограничено дълго време.

Дата: 05.06.2025г.

гр.Пазарджик

Провел изпитанието:

